


Elaborato

R 12



**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE  
DELLA STAZIONE MARITTIMA DI LAMPEDUSA  
REGIONE SICILIANA, COMUNE DI LAMPEDUSA (AG)**

## **CRONOPROGRAMMA**

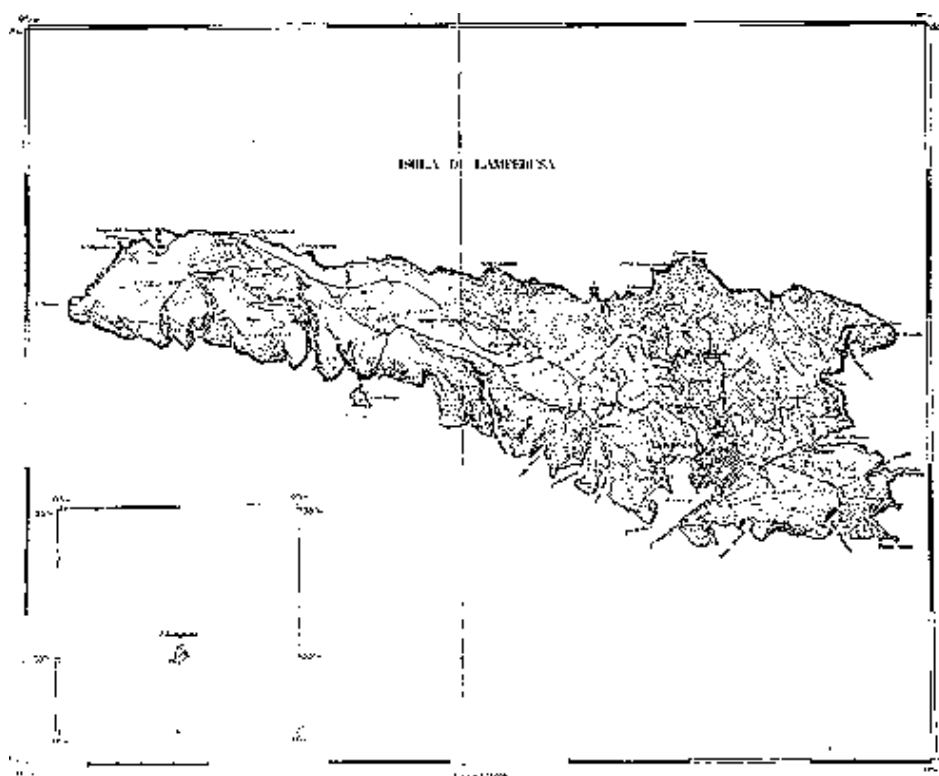

**CODICE CUP: G57H21000580002**

Data Produzione 05.03.2021

il progettista: ing. Marino Alfredo \_\_\_\_\_

collaboratore progettista: ing. Arch. Fiore Marinella \_\_\_\_\_

il R.U.P. per accettazione: \_\_\_\_\_

LA  
RITTIMA DI

ID		Importi	Nome attività	Squ adra	Durata	Inizia	Fine	Luglio																	
								M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M			
1		92 746.4	DEMOLIZIONI		22 g	gio 01/07/2021	dom 01/08/2021																		
2		49 249.8	RIPRISTINI STRUTTURE		22 g	gio 15/07/2021	dom 15/08/2021																		
3		102 230.	COIB. IMP.		21 g	ven 20/08/2021	sab 18/09/2021																		
4		44 830.3	OPERE IN COPERTURA		20 g	lun 06/09/2021	ven 01/10/2021																		
5		159 675.	OPERE EDILI INTERNE		45 g	lun 06/09/2021	ven 05/11/2021																		
6		103 711.	OPERE ESTERNE		21 g	ven 15/10/2021	ven 12/11/2021																		
7		63 311.4	PAVIMENTAZIONI E FIN.		20 g	lun 22/11/2021	ven 17/12/2021																		
8		67 555.6	INFISSI E PORTE		13 g	gio 18/11/2021	lun 06/12/2021																		
9		69 466.8	IDRICO SANITARI		30 g	lun 27/09/2021	ven 05/11/2021																		
10		236 264.	imp elettrici e ant.		40 g	lun 27/09/2021	ven 19/11/2021																		
11		97 195.8	condizionamento		23 g	lun 29/11/2021	mer 29/12/2021																		
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
39																									
40																									
41																									
42																									
43																									
44																									
45																									
46																									
47																									
48																									
49																									
50																									
51																									
52																									
53																									
54																									

Cronoprogramma dei lavori


Attività 

Divisione \_\_\_\_\_

Avanzamento 



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G

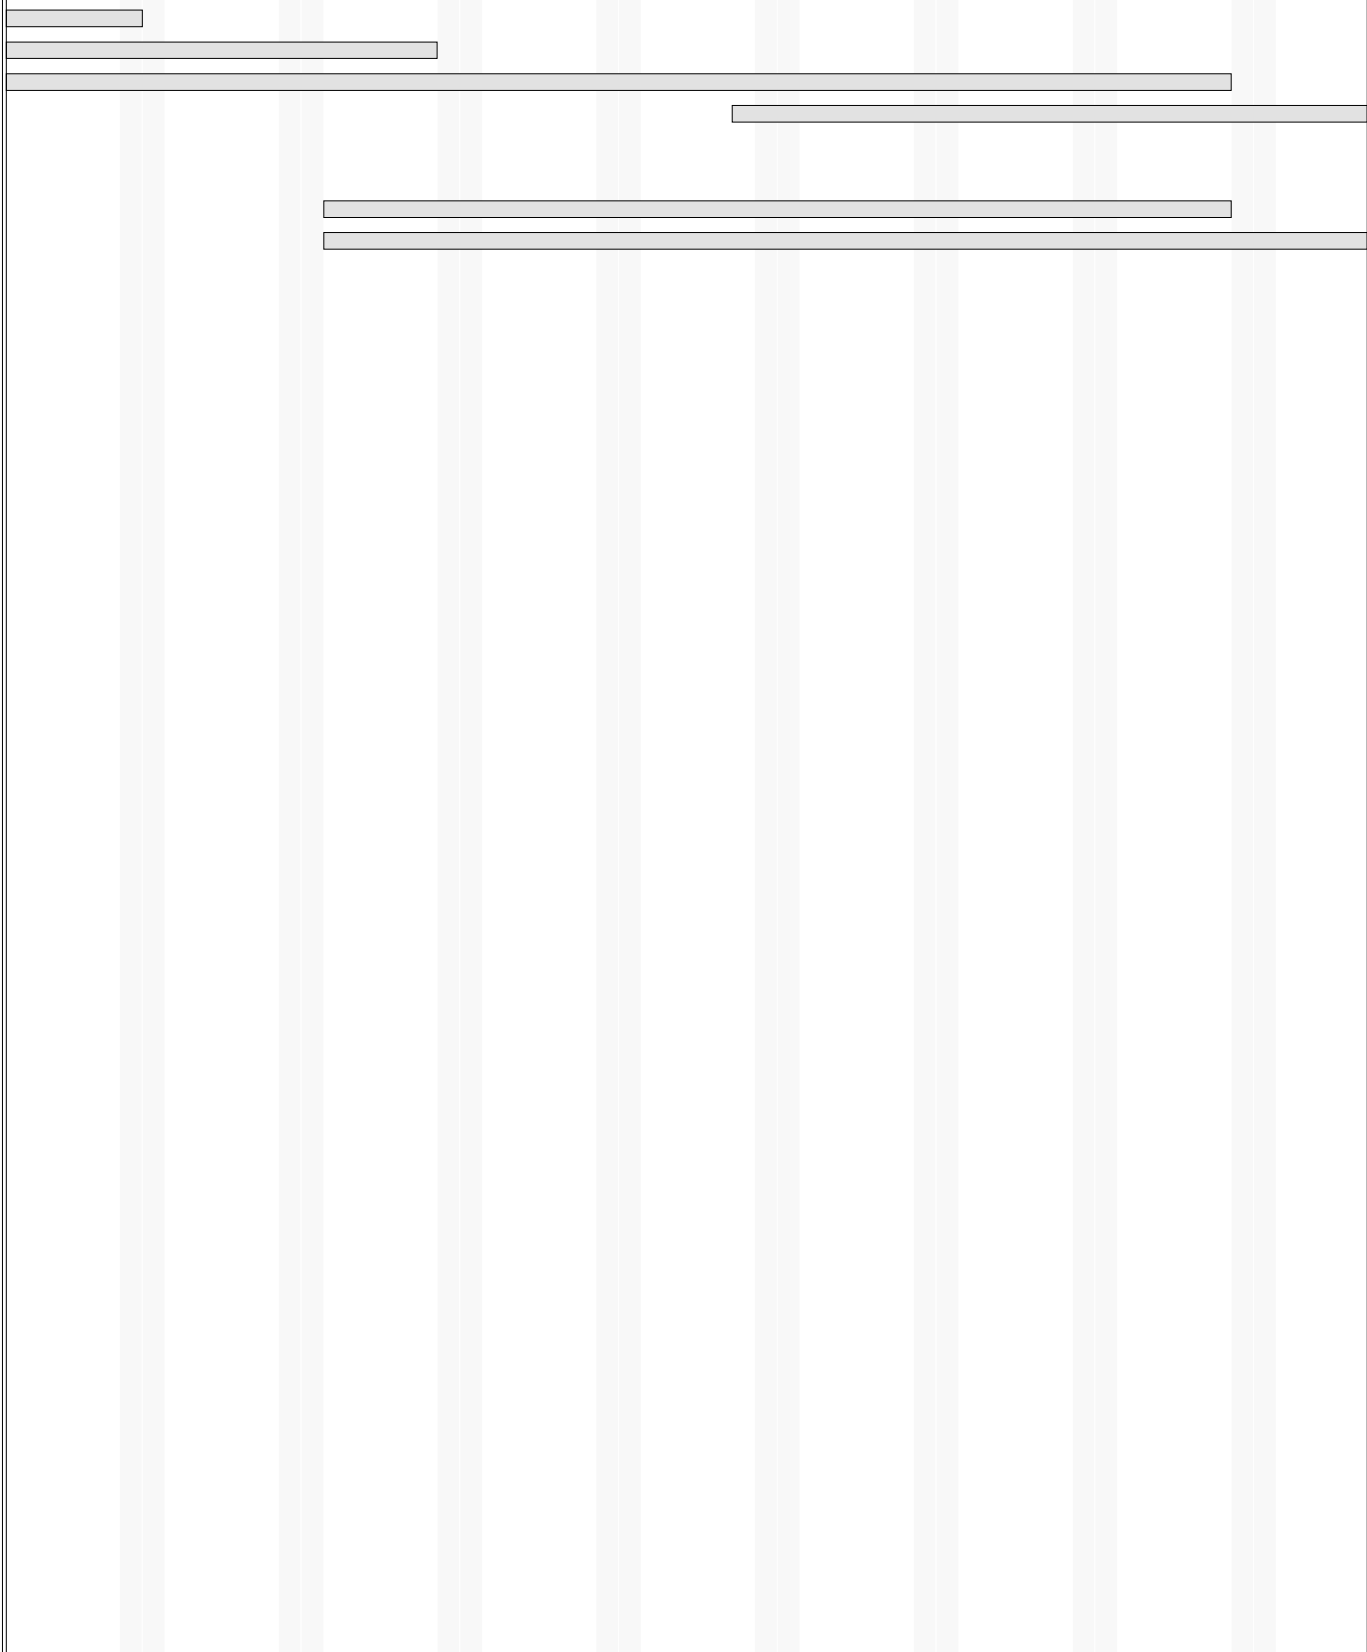


*Cronoprogramma dei lavori*

*Attività*




*Divisione*




*Avanzamento*



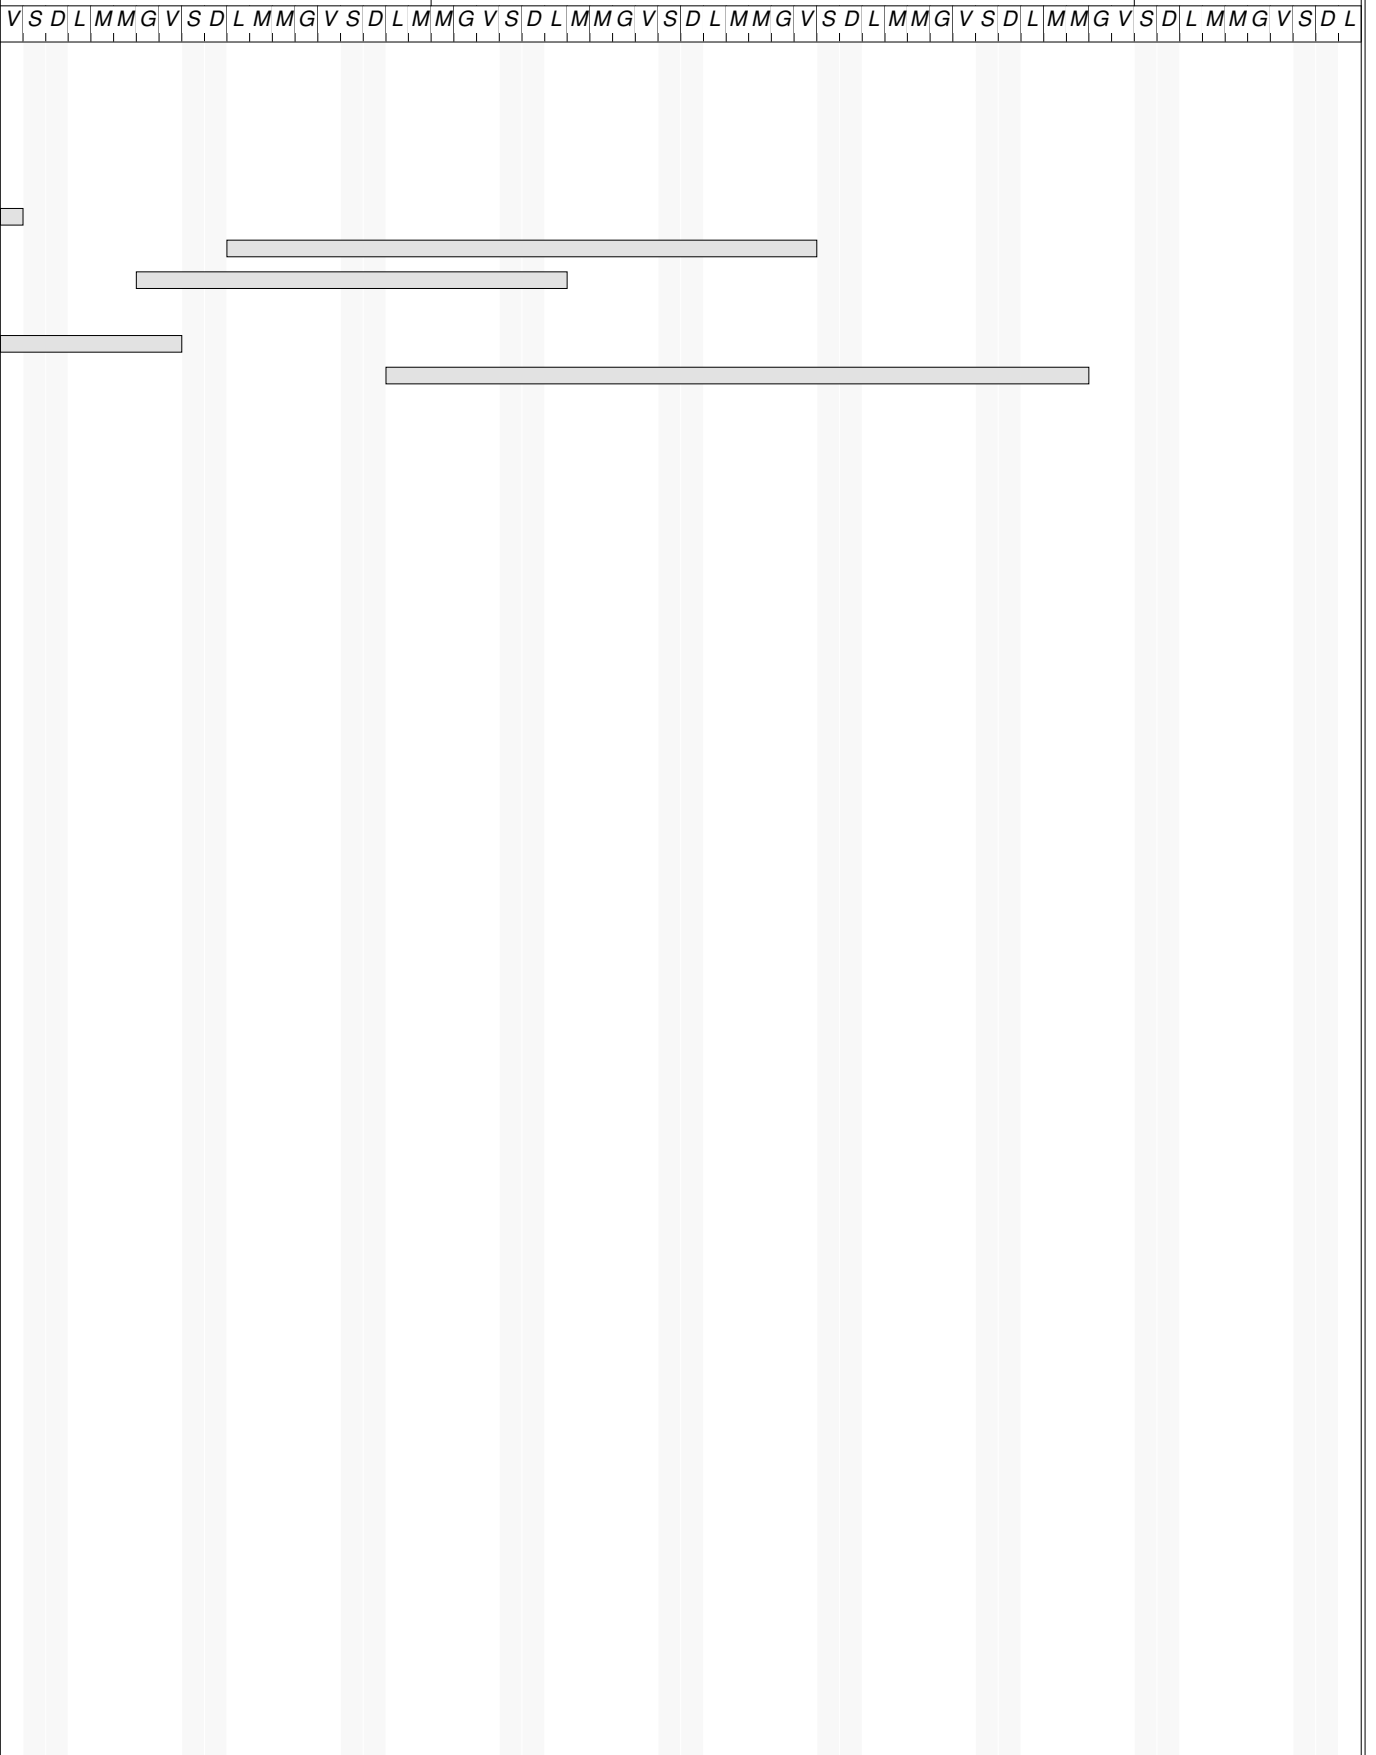

*Cronoprogramma dei lavori*

*Attività*



*Divisione*



*Avanzamento*

