


STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AZIONE 4.1.1. ALTRI ENTI 1^ FINESTRA

PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”

Comune	Prov.	Titolo intervento	Importo progetto	Contributo concesso	Decreto di finanziamento	Importo erogato 1^ anticipazione	Importo erogato 2^ anticipazione	Importo erogato SAL	Stato dell'operazione
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA	CT	Lavori di riqualificazione energetica della sede amministrativa dello istituto autonomo case popolari della provincia di Catania Via Dottor Consoli 80	€ 974.737,51	€ 974.737,51	D.D.G. n. 517 del 03.06.2019	€ 48.736,88	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE DI CATANIA	CT	Lavori di riqualificazione energetica Edificio 3 Policlinico Presidio Ospedaliero Rodolico Catania	€ 4.102.245,54	€ 4.102.245,54	D.D.G. n. 515 del 03.06.2019	€ 205.112,28	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" CATANIA	CT	Efficientamento energetico mirato al miglioramento dell'eco efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria nel Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	D.D.G. n. 516 del 03.06.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
IACP CALTANISSETTA	CL	Promozione dell'eco-efficienza dei consumi di energia primaria nell'edificio sede iacp cl	€ 570.658,02	€ 570.658,02	D.D.G. n. 715 del 08.07.2019	€ 28.532,90	€ 0,00	€ 0,00	Lavori in corso di esecuzione
IPAB A. ALDISIO	CL	Riqualificazione energetica presso centro servizi a.aldisio	€ 956.191,04	€ 956.191,04	D.D.G. n. 511 del 31.05.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato - Nessuna attività in corso
IPAB COLLERALE	ME	Intervento di efficientamento energetico dell'immobile sede dell'IPAB Casa di Ospitalità Collerale sita in via Catania n. 41 Messina	€ 949.909,00	€ 949.909,00	D.D.G. n. 1291 del 24.10.2019	€ 47.495,45	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
CNR ITAE ME	ME	Interventi di riqualificazione energetica della Sede del CNR ITAE ACS da solare termico e solar cooling relamping impianto fotovoltaico da 30 kw	€ 288.530,00	€ 288.530,00	D.D.G. n. 903 del 26/07/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
CAMERA COMMERCIO ME	ME	Progetto di efficientamento e di riduzione dei consumi di energia primaria dell'edificio della Camera di Commercio di Messina sito in Messina Piazza Cavallotti n. 3	€ 255.080,00	€ 255.080,00	D.D.G. n. 576 del 17/06/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
IACP	TP	Riduzione di consumi di energia primaria ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la riqualificazione energetica della sede dello IACP sito in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n. 15	€ 950.000,00	€ 950.000,00	D.D.G. n. 512 del 31.05.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo in fase di approvazione
I.A.C.P. SIRACUSA	SR	Efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'Istituto Autonomo Case Pololari della provincia di Siracusa	€ 2.057.378,17	€ 2.057.378,17	D.D.G. n. 538 del 11.06.2019	€ 102.868,91	€ 0,00	€ 0,00	Lavori appaltati
ASP SIRACUSA	SR	Efficientamento energetico Ospedale Rizza	€ 4.999.653,33	€ 4.999.653,33	D.D.G. n. 521 del 03.06.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Prog. Esecutivo approvato
ASP SIRACUSA	SR	Lavori di efficientamento energetico del presidio ospedaliero di Lentini	€ 4.999.000,00	€ 4.999.000,00	D.D.G. n. 522 del 03.06.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
ASP SIRACUSA	SR	Provveditorato ex onp	€ 2.750.000,00	€ 2.750.000,00	D.D.G. n. 520 del 03.06.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
ASP SIRACUSA	SR	Ospedale di Pachino	€ 3.620.000,00	€ 3.620.000,00	D.D.G. n. 518 del 03.06.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Nessuna attività in corso
OPERA PIA RICCOBONO	PA	Lavori per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi dell'energia primaria dell'ipab Opera Pia Riccobono	€ 2.504.420,33	€ 2.504.420,33	D.D.G. n. 575 del 17.06.2019	€ 125.221,02	€ 0,00	€ 0,00	Progetto definitivo - Nessuna attività in corso
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	PA	Progetto di efficientamento degli impianti tecnologici del "polo sportivo universitario"	€ 1.608.737,25	€ 1.293.737,25	D.D.G. n. 904 del 26.07.2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto definitivo - Nessuna attività in corso
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	PA	Riqualificazione energetica edificio 14 mediante efficientamento impianti di illuminazione e climatizzazione e installazione di un impianto fotovoltaico in copertura	€ 999.659,79	€ 999.659,79	D.D.G. n. 590 del 20.06.2019	€ 49.982,95	€ 0,00	€ 0,00	Progetto esecutivo - Nessuna attività in corso
CASA DELLA FANCIULLA - CASA DI RIPOSO	PA	Interventi finalizzati alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria dell'edificio sede istituzionale dell'ipab casa della fanciulla	€ 650.000,00	€ 650.000,00	D.D.G. n. 750 del 10.07.2019	€ 32.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Progetto definitivo - Nessuna attività in corso
			€ 38.236.199,98	€ 37.921.199,98		€ 640.450,39	€ 0,00	€ 0,00	

Lavori in corso di esecuzione	5,6%	€ 570.658,02
Prog. Esecutivo approvato o in fase di approvazione	16,7%	€ 6.924.390,84
Lavori appaltati o in fase di appalto	5,6%	€ 2.057.378,17
Nessuna attività in corso	72,2%	€ 28.683.863,95
	TOTALE IMPORTO PROGETTI	€ 38.236.290,98

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI PO FESR 2014/2020
Asse Prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo Tematico OT4
AZIONE 4.1.1. ALTRI ENTI 1^ FINESTRA

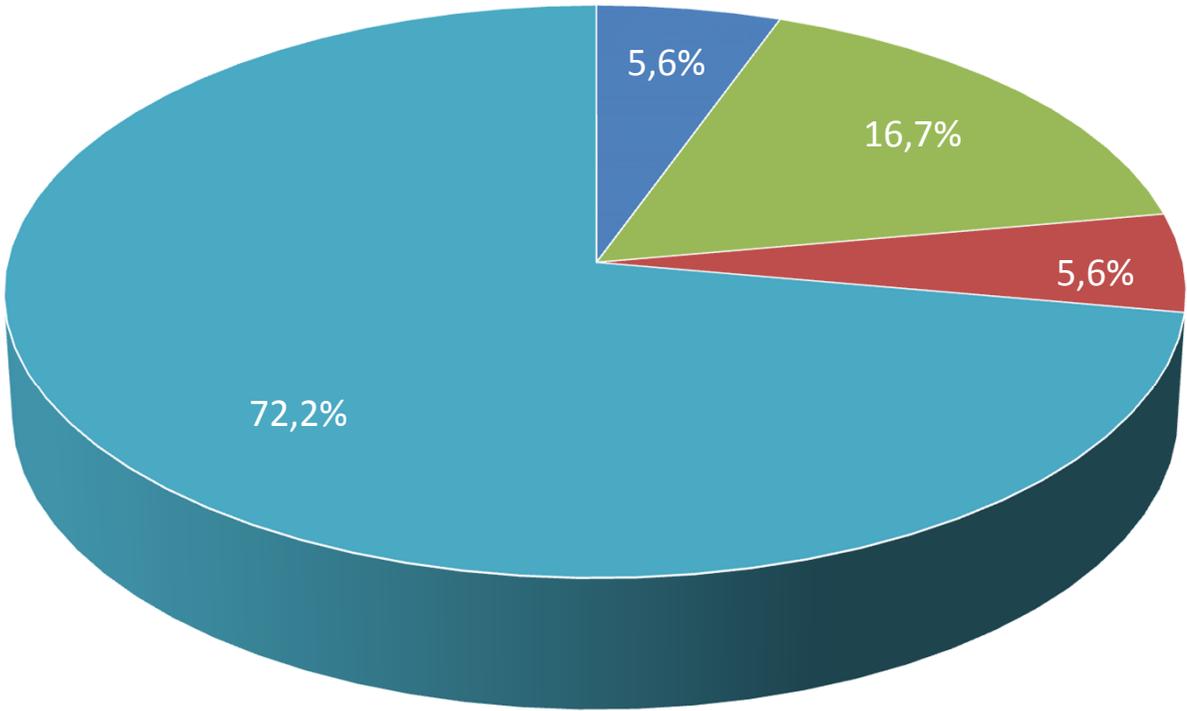

Le percentuali sono riferite al numero totale delle operazioni dell'azione 4.1.1. Altri Enti. 1^ finestra pari a n. 18 interventi. I relativi decreti di finanziamento sono stati emessi nel Maggio 2019.
