



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  
PESCA MEDITERRANEA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 18 UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA**

**D.R.S. N. 89052**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12 "Regolamento di attuazione de Titolo II della L.R. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P. n. 6 del 18/01/2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5/12/2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/06 " Codice degli appalti pubblici" e s.m.i., nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/7/2011 n. 12 che lo ha recepito, e pubblicato, in adempimento al disposto dell'articolo 33 della stessa L.R. 12/2011, sulla GURS n.22 parte I del 1° giugno 2012;
- VISTO** il DPR 05/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006"
- VISTO** il D.P. n. 13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/2011".
- VISTO** l'art. 68 della Legge Regionale 19 agosto 2014, n. 21;
- VISTO** Il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n°9 del 22/02/2008 che, tra gli altri, indica l'ASSE VI : "Sviluppo Urbano Sostenibile" e l'ASSE III: "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo";
- VISTE** la Deliberazione di Giunta Regionale n° 417 del 18/10/2007, relativa al "PO FESR Sicilia 2007/2013 – Adozione definitiva";
- VISTE** le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della Giunta regionale n°266 del 29/10/2008;
- VISTO** il D.D.G.n°1506 del10/07/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg.1. fg.182 con il quale sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3.1.1.3 per le Opere Pubbliche, con istruttoria PIST;
- VISTO** il D.P. n. 3071 del 14/05/2014 con il quale il Presidente della Regione conferisce all'Arch. Felice Bonanno, dirigente regionale di terza fascia, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- Mediterranea, fermo restando la originaria scadenza naturale dell' incarico di Dirigente Generale già conferito con la deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 04/02/2014;
- VISTO** il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;
- VISTO** il D.D.G n. 261 del 15/05/2015 con il quale è stato conferito al Dott. Nunzio Caruso l'incarico di responsabile del Servizio 18 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa con decorrenza 01/05/2015 al 30/06/2017;
- VISTA** la nota prot. n. 9012 del 11 giugno 2013 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali nomina il dott. Filadelfo Brogna Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di cui alla Scheda Operazione n. 05 "Opere di completamento della infrastrutturazione leggera della RNO Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande" del PIST n. 12 – Thapsos Megara – Hyblon Tukles;
- VISTO** il D.D.G. n. 612 del 17 Luglio 2013, di approvazione amministrativa del progetto esecutivo de quo del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali;
- VISTA** la Legge n. 98/2013 art. 32 comma 7 bis;
- VISTA** l'art. 3 della legge regionale del 21 agosto 2007, n. 20;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale BB. CC. AA. e dell'identità siciliana n. 2068 del 22 luglio 2013 con il quale è stata disposta la prenotazione d'impegno sul capitolo 776072 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 3.1.1. del Programma Operativo FESR 2007/13 " del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 della somma di € 2.220.754,85 per la realizzazione dei lavori di "Lavori di completamento della infrastrutturazione leggera e di servizi all'interno della RNO di Pantalica" (SR).
- VISTO** il cronoprogramma aggiornato al 21 luglio 2014 redatto dal progettista in ottemperanza alla nota 4547 del 17/07/2014;
- VISTA** la Determinazione del RUP prot. n° 4871 del 21 luglio 2015 di approvazione del Quadro Economico aggiornato dell'Intervento V1 "Opere di completamento della infrastrutturazione leggera della RNO di Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cavagrande" CUP G53J13000130006, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, del Progetto esecutivo rimodulato del dicembre 2012 di cui al PO 2007/2013 - Attuazione Asse VI - Linea d'intervento 3.1.1.3 - PIST n. 12 – Thapsos Megara – Hyblon Tukles – Scheda Operazione n. 05 "Opere di completamento della infrastrutturazione leggera della RNO Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande";
- VISTO** il D.R.S. n. n° 89028 del 22 luglio 2015 con il quale il Dirigente del Servizio 18 - Ufficio Servizio per il territorio di Siracusa approva la Determinazione del RUP n.4871 ed il Quadro Economico dell'Intervento V1 "Opere di completamento della infrastrutturazione leggera della RNO Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande" CUP G53J13000130006 con Totale comprensivo di Somme a disposizione dell'Amministrazione di € 1.030.323,76 e Totali economie da ribasso d'asta pari a € 222.029,08;
- VISTA** l'approvazione tecnica a cura del RUP n. 6582 del 06/10/2015 relativa alla proposta del Direttore dei Lavori per ulteriori lavorazioni ai sensi del comma 3 dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del comma 10 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- RITENUTO** di dover procedere, a termine delle vigenti disposizioni, all'approvazione dell'Atto di sottomissione del 07/10/2015 Registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n.1760 Serie 3 il 13/10/2015 per l'importo complessivo di € 39.309,78 inclusa IVA 10%;


## DECRETA

### ART.1

In conformità alle premesse, costituenti parti integrali e sostanziali del presente decreto, è **approvato e reso esecutivo l'Atto di sottomissione del 07/10/2015 Registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n.1760 Serie 3 il 13/10/2015** per l'importo complessivo di **€ 39.309,78 inclusa IVA 10%**, che si allega in copia al presente Decreto.

Siracusa, li **21 OTT. 2015**

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Nunzio Caruso

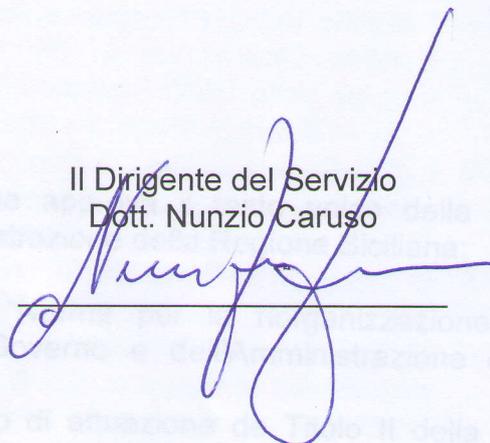

Publicato a norma dell'art. 68 della L.R. 21/2014

il \_\_\_\_\_

1 REPUBBLICA ITALIANA



4 REGIONE SICILIANA

5 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

6 E DELLA PESCA MEDITERRANEA

7 Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

8 Servizio 18 – Ufficio Servizio per il Territorio di Siracusa

9 **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

10 (art. 161 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.)

11 **PO FESR Sicilia 2007/2013 ASSE VI – Linea di intervento**

12 **3.1.1.3 – PIST n.12 Thapsos Megara Hyblon Tukles – Scheda**

13 **Operazione n.05 "Opere di completamento della infrastruttura-**

14 **zione leggera all'interno della R.N.O. di Pantalica, Valle**

15 **dell'Anapo e Torrente Cava Grande" – CUP G53J13000130006 –**

16 **CIG 5654826B8D;**

17 **Contratto n. rep. 217/15 del 08/04/2015 registrato presso**

18 **l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 20/04/2015 al n.**

19 **715 SERIE 1.**

20 **Impresa: AEMME s.r.l. con sede in Favara (AG), Via Ugo La**

21 **Malfa n.74 P.IVA 02503080844.**

22 **Importo lavori base di appalto con corrispettivo a misura pa-**

23 **ri a € 927.978,37, di cui non soggetti a ribasso € 61.384,25**

24 **per oneri per la sicurezza ed € 296.749,62 per spese relative**



25 al costo del personale, oltre I.V.A. al 10%.

26 **Premesso**

27 > che con il contratto riportato in epigrafe l'impresa AEMME  
28 s.r.l. ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo com-  
29 plessivo di € 726.133,75 oltre I.V.A. al 10%;

30 > che con riferimento al progetto esecutivo in questione è  
31 stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante  
32 dall'Arch. Giuseppe Di Mauro;

33 > che la perizia di cui al punto precedente è stata redatta  
34 ai sensi di quanto previsto dall'art. 132, co. 3 secondo pe-  
35 riodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per affiancare impresa  
36 terza per l'attività specialistica di posa della fibra ottica  
37 con la parte edile nonché per la sistemazione finale del  
38 tracciato dell'ex ferrovia giusta approvazione del 02/10/'15.

39 Tutto ciò premesso, l'anno duemilaquindici il giorno sette  
40 del mese di ottobre con il presente si conviene quanto segue:

41 **Art. 1**

42 Il Sig. Bruccoleri Massimiliano, nato a Favara il 11/10/1970  
43 (C.F. BRCMSM70R11D514G), in qualità di legale rappresentante  
44 della Società AEMME s.r.l., P.IVA 02503080844, assume  
45 l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori la-  
46 vori previsti in perizia secondo le quantità specificate ed  
47 agli stessi patti e condizioni del contratto indicato a mar-  
48 gine ed agli stessi prezzi unitari fissati nello stesso, sog-

49 getti al ribasso d'asta di cui sopra del 35,4210%.

50 **Art. 2**

51 L'importo complessivo dei lavori di che trattasi, tutti a mi-  
52 sura, ammonta a € 35.736,16 oltre IVA 10%, comprensivo di  
53 spese per manodopera pari a € 23.047,16 e oneri per la sicu-  
54 rezza pari a € 621,20, per un totale complessivo lavori di  
55 perizia di € 39.309,78. Le lavorazioni omogenee aggiuntive al  
56 netto di IVA, già approvate nel contratto stipulato, sono:

57 > scavo a sezione e relativo ricoprimento con supporto in lo-  
58 co di operaio qualificato ed operaio comune (rif. articoli  
59 01.01.05.01 e 01.02.03 dell'elenco prezzi per una quantità di  
60 1,52 mc. cad., OP.QUAL. e OP.COM dei prezzi elementari per  
61 una quantità di 3h cad.) per un costo unitario di € 143,33  
62 per punto di passaggio fibra ed un numero complessivo di 110;  
63 > rifacimento di tratti stradali in terra battuta (rif. arti-  
64 colo AP 002 DC) per un costo di € 28,95 al mc. ed una quanti-  
65 tà aggiuntiva prevista di 689,7 mc.

66 **Art. 3**

67 L'importo del presente atto risulta pari a € 761.869,91 (euro  
68 settecentosessantunomilaottocentosessantannove/91) oltre IVA  
69 10% come in appresso specificato:

70 > Importo lavori di perizia: € 39.309,78 oltre IVA 10%;

71 > Importo contratto principale: € 726.133,75 oltre IVA 10%;

72 I maggiori lavori di perizia, come sopra specificati, rispet-

73 to al contratto principale, sono soggetti alla registrazione  
74 fiscale.

75 **Art. 4**

76 Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presen-  
77 te perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare  
78 ultimati i lavori, già fissati dal Capitolato Speciale  
79 d'Appalto in giorni 105 (centocinque) viene aumentato di  
80 gg.41 (quarantuno).


81 -----  
82 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore men-  
83 tre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le  
84 approvazioni di legge.

**Il Direttore dei Lavori**

**L'Appaltatore**

Arch. Giuseppe Di Mauro

Geom. Massimiliano Bruccoleri




*[Handwritten signature of Giuseppe Di Mauro]*

**AEMME (S.R.L.)**  
L'Amministratore unico  
*(Bruccoleri Massimiliano)*

*[Handwritten signature of Massimiliano Bruccoleri]*

**Visto il Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Filadelfo Brogna



*[Handwritten signature of Filadelfo Brogna]*

**Registrato**  
ad Agrigento

al N. 1760  
Serie 3  
il 13 OTT. 2015  
versate € 200,00

*[Large handwritten signature in blue ink]*



L'impiegato **LA/PA F3**  
Indelicato Calogero

Firma su delega del Direttore Provinciale  
Dott. Pietro Pasquale Leto
